


验线表

建设单位	南阳新田置业有限公司
工程名称	南阳市化纤厂区域城市更新项目
完成单位	南阳市城乡规划测绘院

验线关系示意图

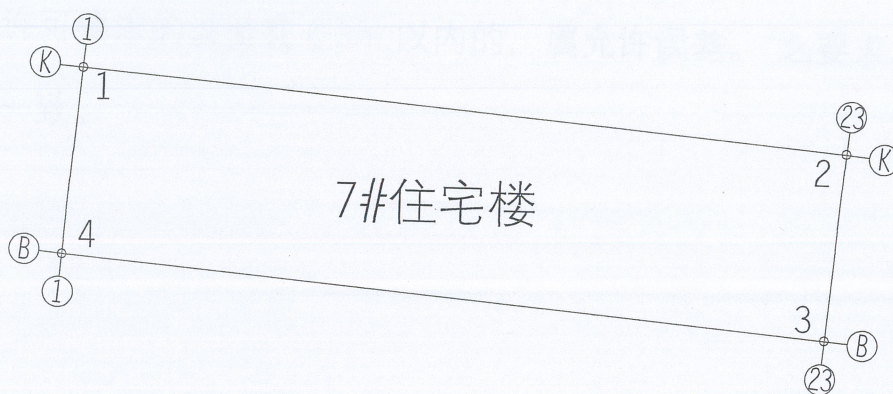

实测偏差

点号	设计值 (X,Y)		实测值 (X,Y)		差值 ΔL
	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)	ΔL (m)
1	49870.835	100640.363	49870.825	100640.372	0.013
2	49867.144	100681.976	49867.107	100682.006	0.048
3	49857.025	100681.078	49856.997	100681.103	0.038
4	49860.716	100639.465	49860.715	100639.469	0.004

备注：点位偏差是相对原放样位置为基点的相对偏差

- 注：1. 验线为1幢楼4个点。
2. 所标点号为实测楼位置。

项目负责人：*梁豪*

审核：*宿松*



验线报告

我院于 2023 年 2 月 6 日对南阳新田置业有限公司南阳市化纤厂区域城市更新项目 7#住宅楼进行验线，成果见放验线记录册。

验线符合《南阳市城市规划管理技术规定（试行）》第八节第 3.8.1 款“建筑工程的实测建筑间距，建筑物长宽尺寸、建筑退让用地界限、道路红线等有关间距与规划许可要求的误差在 0.3m 以内的，属允许误差。”之要求，验线结果与规划审批一致。

